

Fasi di costruzione


- Fase 0

Lavori preliminari
- Fase 1

Lavori sulla carreggiata S-N e bretella SPA394-N2 (dir. Mendrisio)
- Fase 2

Lavori sulla carreggiata N-S e bretella N2-SPA394 (dir. Stabio)
- Fase 3 + 4

Svincolo Mendrisio (1° e 2° parte), nuova strada Cantonale e svincolo Rancate

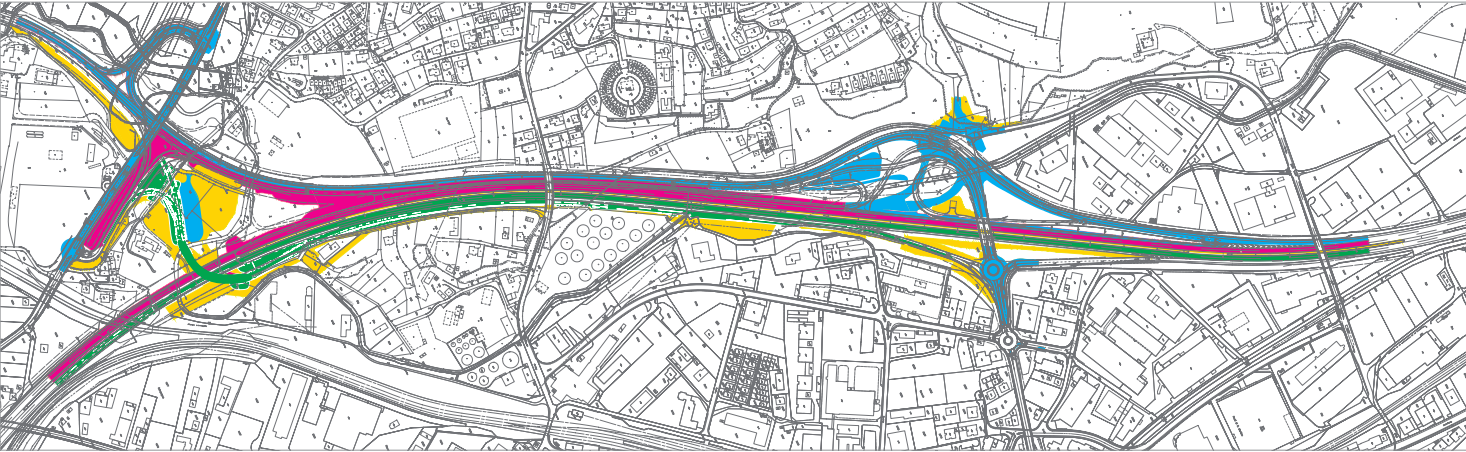

Programma lavori

		2013				2014				2015				2016				2017			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Lavori preliminari "Fase 0"	A																				
	B																				
	C																				
	D																				
	E																				
Lavori principali	Fase 1																				
	Fase 2																				
	Fase 3																				
Conduzione traffico A2																					

Opere previste nella Fase 0 (2013 - 2014)

La fase 0 comprende i lavori preliminari, previsti prevalentemente al di fuori del campo autostradale che si concentreranno principalmente su cinque provvedimenti:

- A

la preparazione delle aree di cantiere in zona Tana, dove verrà svolta la maggior parte dei lavori principali e dove saranno ubicate le installazioni logistiche; l'ampliamento della cabina di trasformazione elettrica in zona Svincolo;
- B



la pavimentazione dello spartitraffico;
- C

gli allargamenti laterali della carreggiata autostradale, in modo da consentire la futura gestione del traffico durante le principali fasi di cantiere;
- D

la posa di un ponte provvisorio accanto al viadotto esistente della Tana;
- E

le opere di sostegno presso la carreggiata Sud – Nord.

Gestione del traffico A2

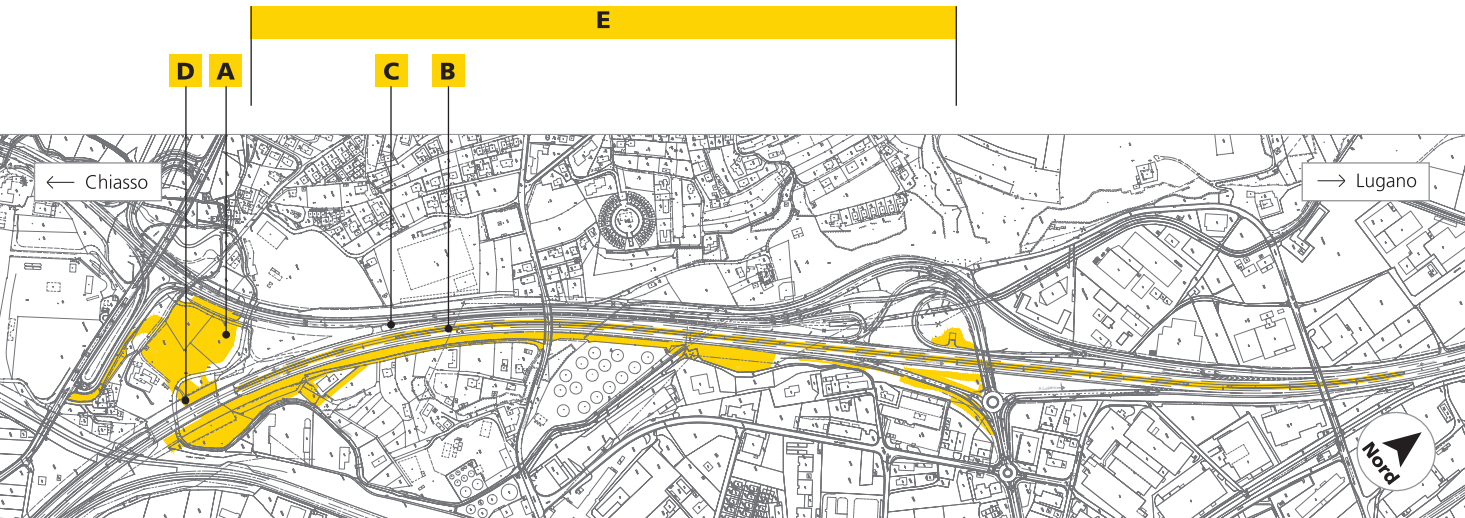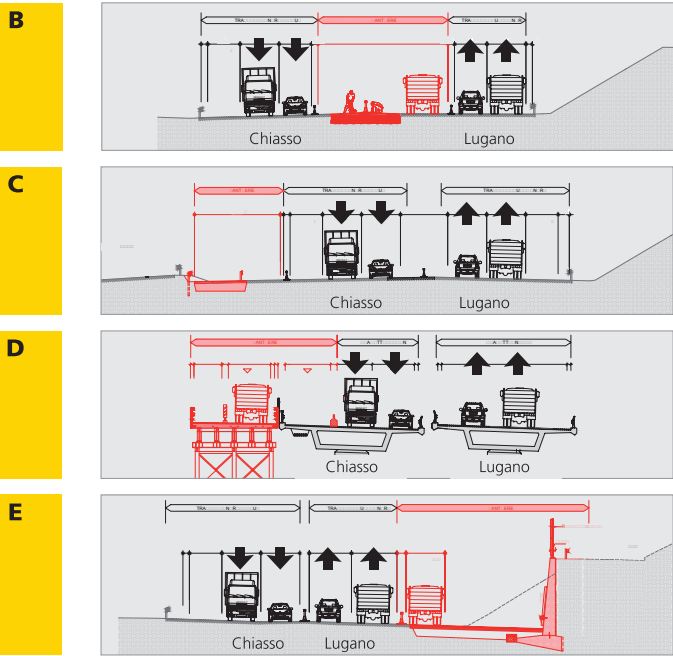

Riorganizzazione dello svincolo di Mendrisio 2013 - 2016

USTRA Filiale di Bellinzona - Marzo 2013



