



Anwohnerinfo

A2 Erhaltungsprojekt Hagnau–Augst

Informationen zu den Arbeiten



Stand der Bauarbeiten

Seit Anfang März 2025 wird der Autobahnabschnitt Hagnau–Augst instandgesetzt. Gearbeitet wird während dieses Jahres in den sechs Teilprojekten «Trasse», «Kunstabauten», «Tunnel Schweizerhalle», «Portalverlängerung Tunnel Schweizerhalle», «Betriebszentrale Süd-Ost», sowie «Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen». Die Ausführung der Arbeiten erfolgt grossmehrheitlich in Nachtarbeit. Zum aktuellen Stand der Bauarbeiten die folgenden Informationen:

Teilprojekt Trasse

Von April bis Oktober wird während rund 80 Nächten auf dem gesamten Abschnitt ausserhalb des Tunnels Schweizerhalle ein neuer Deckbelag eingebaut. Aktuell ist rund die Hälfte der Arbeiten abgeschlossen, was dem geplanten Terminprogramm entspricht. Das Teilprojekt wird voraussichtlich **Ende Oktober 2025** abgeschlossen.

Teilprojekt Kunstbauten

Die Instandsetzung der insgesamt 14 Objekte, u.a. von Fahrbahnübergängen, Brückenlagern, Rückhaltesystemen (Leitplanken) etc., erfolgt im Schatten der Trasseearbeiten und damit ebenfalls in Nachtarbeit. Gemäss derzeitigem Arbeitsstand kann dieses Teilprojekt **Ende Oktober 2025** abgeschlossen werden.

Teilprojekt Tunnel Schweizerhalle

In Tag- und teilweiser Nachtarbeit werden dieses Jahr im und ausserhalb des Tunnels die Fassadenaussenwand, die Mittelwand, die Rückwand sowie die Brüstungselemente instandgesetzt und neue Fluchttüren eingebaut. Der Arbeitsfortschritt entspricht den geplanten Terminvorgaben. Die Arbeiten im Bauprogramm 2025 werden voraussichtlich im **Januar 2026** beendet.

Teilprojekt Portalverlängerung

Das Portal in Fahrtrichtung Hagnau des Tunnels Schweizerhalle wird um 25 Meter verlängert. Zudem werden zusätzliche Strahlventilatoren montiert. Auch diese Arbeiten schreiten plangemäss voran. **Anfang November 2025** dürfte dieses Teilprojekt abgeschlossen werden.

Teilprojekt Betriebszentrale Süd-Ost

Gemäss derzeitigem Kenntnisstand dürften die Rohbauarbeiten termingemäss Anfang September 2025 abgeschlossen sein. Ab zweiter Hälfte August 2025 sind die Innenausbauarbeiten, u.a. im Bereich der Heizung, der Lüftung und der Klimatechnik, im Gange. Es ist davon auszugehen, dass diese Arbeiten **Anfang Februar 2026** beendet sein werden.

Teilprojekt Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA)

Die Arbeiten konzentrieren sich im Jahr 2026 auf die Instandsetzung der Infrastrukturen an den Kunstbauten sowie auf Vorbereitungsarbeiten für die per 2026/2027 geplante Ausrüstung der 280 Querträger mit kathodischem Korrosionsschutz im Tunnel Schweizerhalle. Die Vorbereitungsarbeiten werden termingerecht per **Ende 2025** abgeschlossen werden können.

Verkehrseinschränkungen und Lärmimmissionen

Das Verkehrs- und das Baustellenbetriebskonzept haben sich während der Bauzeit als zielführend erwiesen. Dem Anspruch nach gutem Verkehrsfluss auf der einen Seite und ausreichend Platz für die Instandsetzungsarbeiten auf der anderen Seite kann entsprochen werden. Zudem setzen die Bauherrschaft und die mit der Umsetzung der Bauarbeiten beauftragten Unternehmen alles daran, einen möglichst lärmschonenden Baustellenbetrieb zu gewährleisten.

Arbeiten 2025, Sperrungen, Fahrspurabbauten und Lärmimmissionen

Trasse: Neuer Fahrbahnbelag

Der Einbau eines neuen Fahrbahnbelags auf beiden Fahrbahnen zwischen Hagnau und Augst geht in die letzte Teilstrecke. Ab Mitte August 2025 bis Ende Oktober 2025 wird auf dem letzten Abschnitt der Fahrbahn Chiasso, zwischen dem Ostportal des Tunnels Schweizerhalle und Augst, ein neuer Belag eingebaut. Gearbeitet wird ausschliesslich in der Nacht. Die nötig werdenden Fräsarbeiten können **jeweils bis spätestens 24 Uhr** zu Lärmimmissionen führen.

Betriebszentrale Süd-Ost: Sperrung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Chiasso infolge Krandemontage

In der **Nacht von Dienstag, 2. September 2025, auf Mittwoch, 3. September 2025, zwischen 22 Uhr und 5 Uhr**, erfolgt im Bereich der Betriebszentrale Süd-Ost (beim Westportal des Tunnels Schweizerhalle) die Krandemontage. Die Demontage führt im Baustellenbereich zur Sperrung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Chiasso. Der Verkehr wird auf das nachgelagerte Verkehrsnetz abgeleitet.

Überführung Zurlinden, Pratteln: Sperrung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Chiasso infolge Anprallschutzmontage

In der Nacht von **Dienstag, 2. September 2025, auf Mittwoch, 3. September 2025, zwischen 22 Uhr und 5 Uhr**, erfolgt bei der Überführung Zurlinden, zwischen dem Anschluss Pratteln und der Raststätte Pratteln, die Montage eines Anprallschutzes. Die Umsetzung dieser Massnahme macht die Sperrung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Chiasso nötig. Der Verkehr wird auf das nachgelagerte Verkehrsnetz abgeleitet.

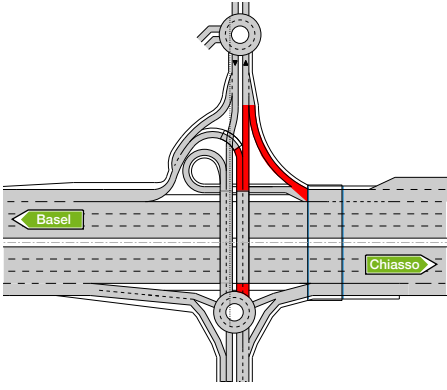





Portalverlängerung Tunnel Schweizerhalle

Im Rahmen der Portalverlängerung Tunnel Schweizerhalle wird von Montag, 8. September 2025, bis Mittwoch, 17. September 2025, das Lehrgerüst der Decke demontiert. Hierfür werden von **Montag, 8. September 2025, bis Freitag, 12. September 2025, sowie von Sonntag, 14. September 2025, bis Mittwoch, 17. September 2025, jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr**, nächtliche Totalsperrungen der Tunnelröhre Basel mit Überleitung des Verkehrs auf die Gegenfahrbahn nötig.

Anschluss Liestal: Sperrungen der Ein- und Ausfahrten in beide Fahrtrichtungen

Von Sonntag, 14. September 2025, bis Donnerstag, 25. September 2025, werden im Bereich des Anschlusses Liestal Instandsetzungsarbeiten ausgeführt. Nächtliche Sperrungen der Ein- und Ausfahrten werden unausweichlich.


In allen vier Ein- und Ausfahrtsbereichen wird ein neuer Deckbelag eingebaut. Die Ausführung dieser Massnahme macht nächtliche Sperrungen der betroffenen Ein- und Ausfahrten **von jeweils 20 Uhr bis 5 Uhr nötig**. Zu den Etappen, Terminen und Sperrungen die folgenden Angaben:

Etappe	Nacht	Sperrung
1 	Sonntag, 14. Sept. auf Montag, 15. Sept. 2025	Überführung A2 von Liestal in Fahrtrichtung Augst sowie Einfahrt von Liestal auf A2, Fahrbahn Basel Ausfahrt ab A2, Fahrbahn Basel, nach Augst und Liestal
2 	Montag, 15. Sept. auf Dienstag, 16. Sept. 2025	Einfahrt von Augst und Liestal auf A2, Fahrbahn Basel
3 	Dienstag, 16. Sept. auf Mittwoch, 17. Sept. 2025	Einfahrt von Augst und Liestal auf A2, Fahrbahn Basel
4 	Mittwoch, 17. Sept. auf Donnerstag, 18. Sept. 2025	Ausfahrt ab A2, Fahrbahn Basel, in Fahrtrichtung Augst und Liestal (Überführung A2 in Fahrtrichtung Augst offen)
5 	Sonntag, 21. Sept. auf Montag, 22. Sept. 2025	Ausfahrt ab A2, Fahrbahn Chiasso, in Fahrtrichtung Augst und Liestal (Kreisel Einfahrt A2 in Fahrtrichtung Chiasso offen)
6 	Montag, 22. Sept. auf Dienstag, 23. Sept. 2025	Ausfahrt ab A2, Fahrbahn Chiasso, in Fahrtrichtung Augst und Liestal (Kreisel Einfahrt A2 in Fahrtrichtung Chiasso offen)



Etappe

7



Nacht

Dienstag, 23. Sept. auf
Mittwoch, 24. Sept. 2025


Sperrung

A2 in beiden Fahrtrichtungen zwischen
Hülftenkreisel und Kreisel Anschluss Liestal Süd

Ausfahrt ab A2, Fahrbahn Chiasso,
nach Liestal, sowie Einfahrt von Liestal auf A2
Fahrtrichtung Chiasso

Ausfahrt ab A2, Fahrbahn Basel,
in Fahrtrichtung Liestal

8



Mittwoch, 24. Sept. auf
Donnerstag, 25. Sept. 2025

Einfahrt von Liestal und Augst auf A2,
Fahrbahn Chiasso

Zum Projekt

Die A2 zwischen Hagnau und Augst ist einer der meistbefahrenen Autobahnabschnitte der Schweiz. Nach rund 50-jähriger Betriebsdauer sowie aufgrund der hohen Belastungen ist eine Instandsetzung unausweichlich.

Ziele der zwischen 23. Februar 2025 und Mitte 2028 stattfindenden Instandsetzungsarbeiten sind die Werterhaltung sowie die Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit der Infrastruktur durch bauliche Massnahmen. Zudem wird der Streckenabschnitt den geltenden Vorschriften und Normen angepasst, wodurch die Verkehrssicherheit auch in Zukunft aufrechterhalten bleibt.

Nach Beendigung der Instandsetzungsarbeiten ist die Funktionstüchtigkeit und Gebrauchstauglichkeit des Autobahnabschnittes für die kommenden 15 Jahre sichergestellt.

Umleitungen über das nachgelagerte Strassennetz werden eingerichtet und signalisiert. Für den Transitverkehr in Fahrtrichtung Chiasso und Basel steht die Autobahn A2 durchgehend zur Verfügung. Je nach Etappe und Bauablauf sind Fahrspurabbauten im Baustellenbereich nicht auszuschliessen.

Der Einbau des Deckbelages ist stark witterungsabhängig. Terminverschiebungen sind nicht auszuschliessen. Reservetermine sind die Nächte

- von Donnerstag, 18. September 2025, auf Freitag, 19. September 2025,
- von Donnerstag, 25. September 2025, auf Freitag, 26. September 2025, sowie
- von Sonntag, 28. September 2025, bis Freitag, 3. Oktober 2025.

Die Ausführung der voranstehenden Arbeiten ist witterungsabhängig. Bauablauf- und witterungsbedingte Terminverschiebungen sind daher nicht auszuschliessen.

Wir danken für Ihr Verständnis gegenüber den unumgänglichen Arbeiten.

Ansprechpartner

Bundesamt für Strassen ASTRA, Infrastrukturfiliale Zofingen,
Telefon 058 482 75 11, zofingen@astra.admin.ch

Weitere Informationen zum Projekt: www.autobahnschweiz.ch
Bundesamt für Strassen ASTRA
Infrastrukturfiliale Zofingen

August 2025

